





# FERROVIE APPULO LUCANE

## RADDOPPIO SELETTIVO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE DI VENUSIO PER L'INCROCIO DINAMICO DEI TRENI

### - PROGETTO DEFINITIVO -

5					
4					
3					
2					
1					
0	Gennaio 2018	WStrafella	PStasi	PStasi	Prima Emissione
Em./Rev	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione
Redazione grafica: ETACONS S.r.l. – P.ta S. G. dei Fiorentini n.1 –73100 LECCE Tel(0832)331418/7 Fax(0832)331486 E-mail: mail@etacons.it					Cod. N°: <b>E282-D</b>
<u>Titolo dell'allegato</u>					<u>Allegato n.</u>
<b>CRONOPROGRAMMA</b>					<b>L</b>
					<u>Scala</u>
<u>Progettazione:</u>			<u>Committente:</u>		
 - Ing. Primo Stasi			 FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.		

# **CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI**

ID	Nome	Durata 238,00 g	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39							
1	1 - INCANTIERAMENTO	14,00																																														
2	2 - ALLARGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA	143,92																																														
3	3 - ARMAMENTO	128,08																																														
4	4 - VIABILITA' PODERALE E SOPPRESSIONE PL	4,00																																														
5	5 - IMPIANTI DI SEGNALAMENTO	133,00																																														
6	6 - COLLAUDI	21,00																																														
7	7 - SMOBILIZZO CANTIERE	14,00																																														

# **PROGRAMMA DEI LAVORI**

**PROGRAMMA DEI LAVORI**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ricavi</b>	da 1 a 79	da 80 a 105	da 106 a 125	da 126 a 145	da 146 a 171	da 172 a 199
1 - INCANTIERAMENTO							
2 - ALLARGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA	€ 1.545.361,68	€ 773.128,25	€ 279.185,20	€ 214.757,85	€ 214.757,85	€ 63.532,53	
3 - ARMAMENTO	€ 1.676.655,24	€ 26.180,69	€ 340.349,01	€ 261.806,93	€ 261.806,93	€ 340.349,01	€ 366.529,71
4 - VIABILITA' PODERALE E SOPPRESSIONE PL	€ 52.382,88	€ 52.382,88					
5 - IMPIANTI DI SEGNALAMENTO	€ 2.341.587,19		€ 246.482,86	€ 352.118,37	€ 352.118,37	€ 457.753,89	€ 492.965,72
6 - COLLAUDI							
7 - SMOBILIZZO CANTIERE							
<b>IMPORTO</b>		€ 851.691,82	€ 866.017,07	€ 828.683,15	€ 828.683,15	€ 861.635,43	€ 859.495,43
<b>IMPORTO PROGRESSIVO</b>		€ 851.691,82	€ 1.717.708,89	€ 2.546.392,04	€ 3.375.075,19	€ 4.236.710,62	€ 5.096.206,05
%		15,17%	15,42%	14,76%	14,76%	15,34%	15,30%
% PROGRESSIVA		15,17%	30,59%	45,34%	60,10%	75,44%	90,74%

## PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 200 a 238					
1 - INCANTIERAMENTO							
2 - ALLARGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA	€ 1.545.361,68						
3 - ARMAMENTO	€ 1.676.655,24	€ 79.632,96					
4 - VIABILITA' PODERALE E SOPPRESSIONE PL	€ 52.382,88						
5 - IMPIANTI DI SEGNALAMENTO	€ 2.341.587,19	€ 440.147,98					
6 - COLLAUDI							
7 - SMOBILIZZO CANTIERE							
IMPORTO		€ 519.780,94					
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 5.615.986,99					
%		9,26%					
% PROGRESSIVA		100,00%					


**PROGRAMMAZIONE S.A.L.**

PROGRAMMA S.A.L.						
DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
	79	79	€ 851.691,83	€ 851.691,83	15,17%	Si
	105	26	€ 1.717.708,90	€ 866.017,07	30,59%	Si
	125	20	€ 2.546.392,06	€ 828.683,16	45,34%	Si
	145	20	€ 3.375.075,22	€ 828.683,16	60,10%	Si
	171	26	€ 4.224.850,72	€ 849.775,50	75,23%	Si
	199	28	€ 5.071.323,50	€ 846.472,78	90,30%	Si
	238	39	€ 5.615.986,99	€ 544.663,49	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 238 (duecentotrentotto) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



# **DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI**

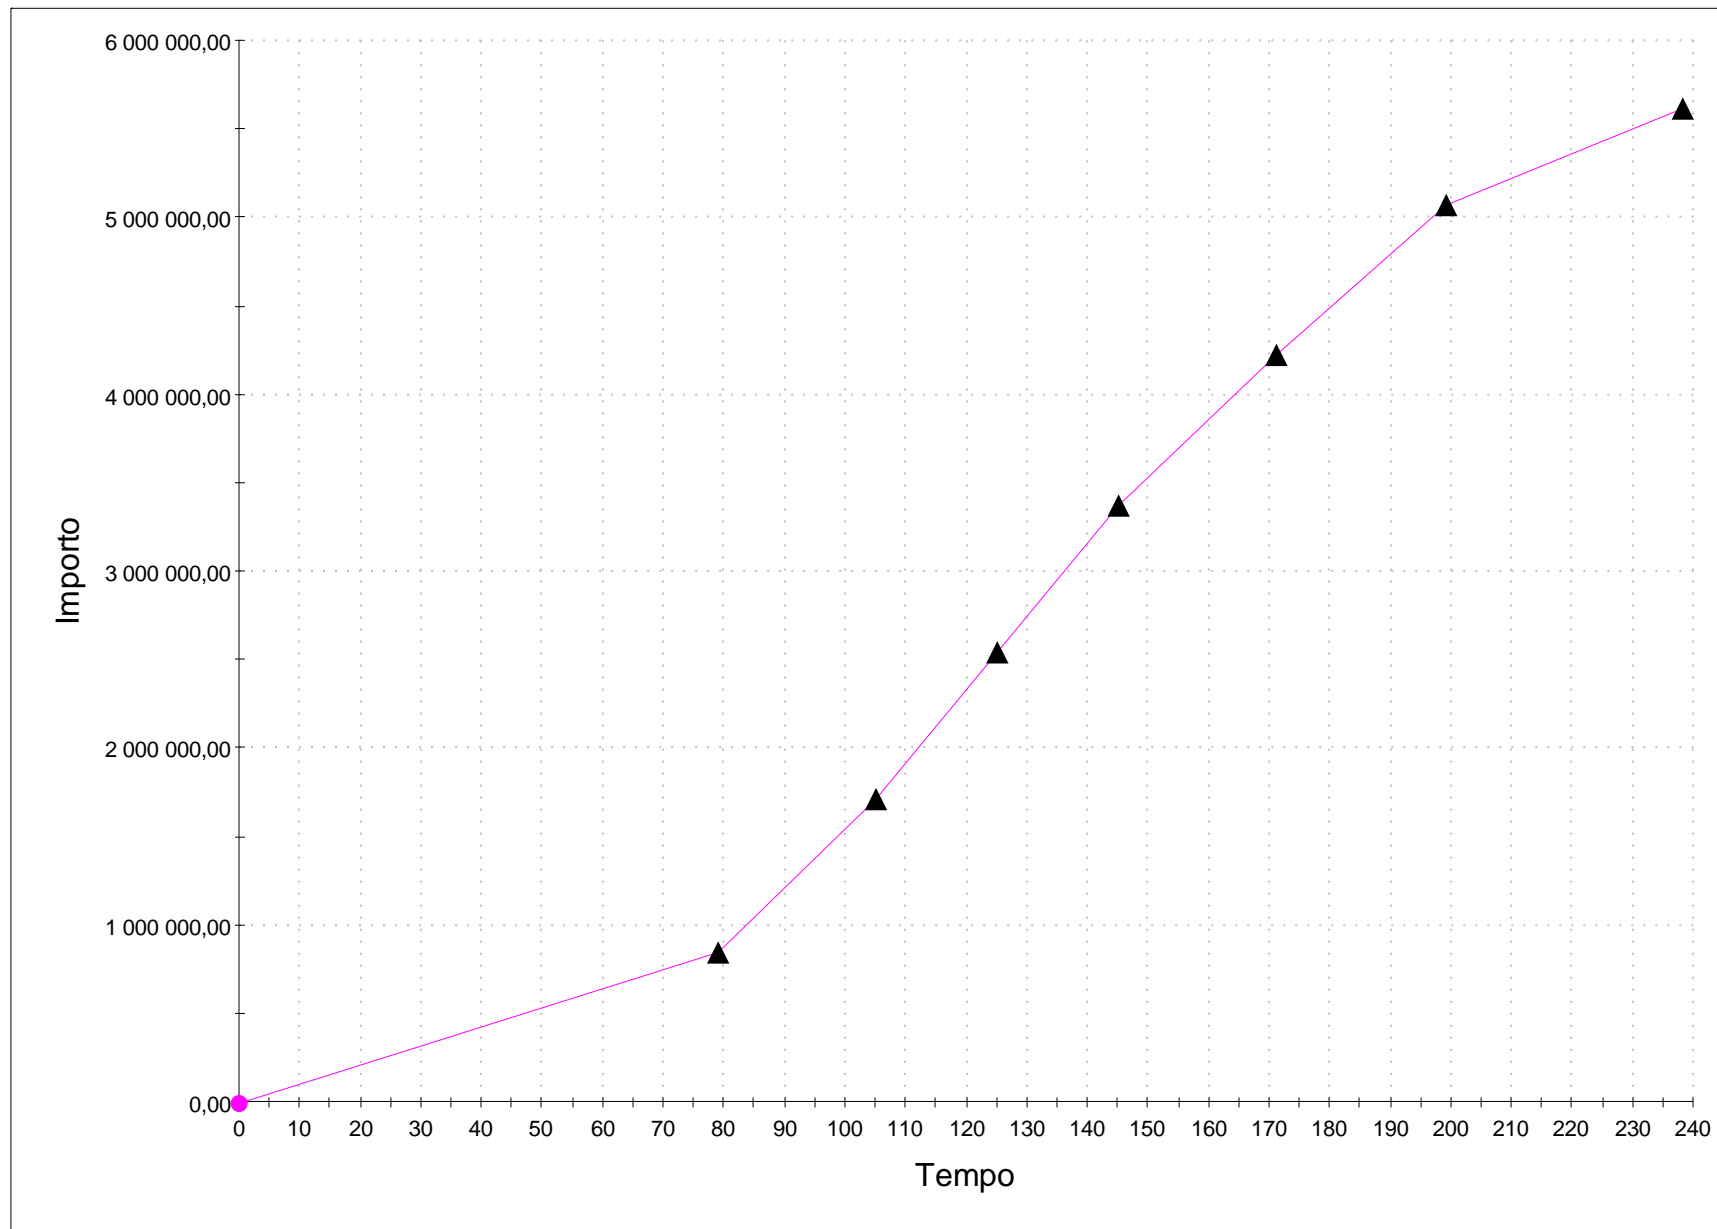

LEGENDA: ▲ Stato Avanzamento Lavori programmato
